DIO M-Silnice - HK, Mileta

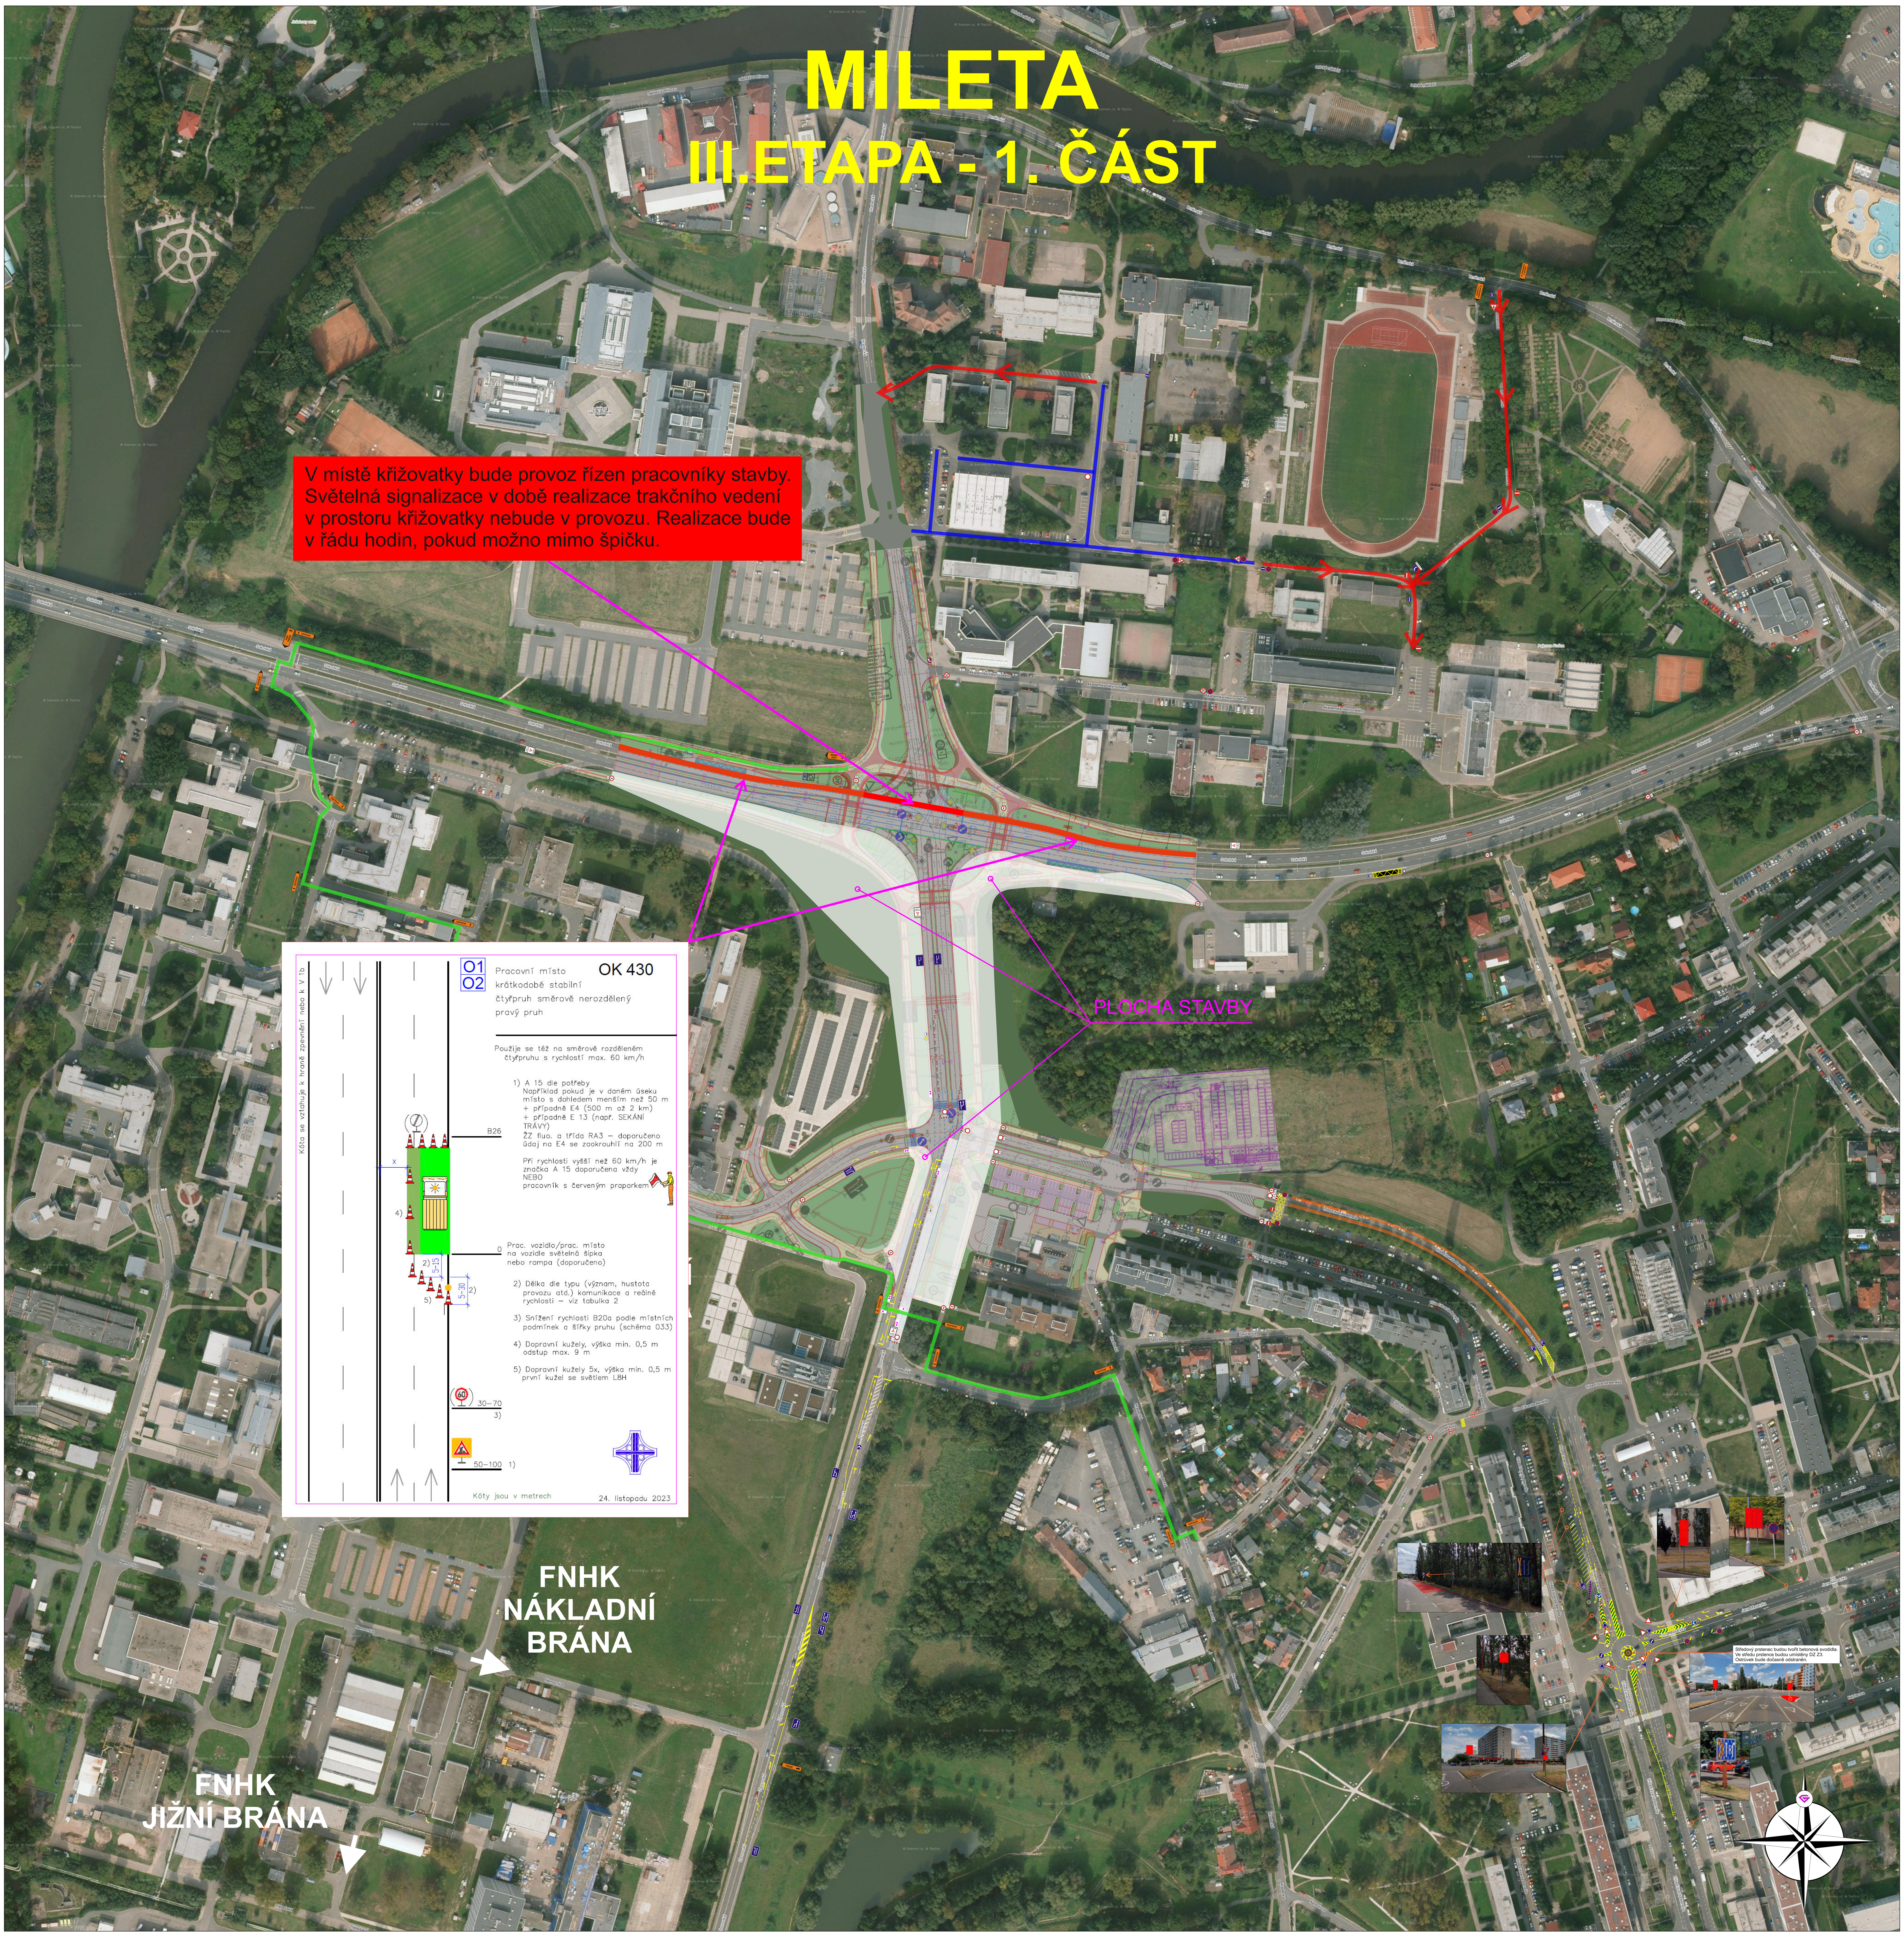

Na vyznačeném úseku bude úplná uzavírka. Úplná uzavírka nebude průchozí - obchozí trasy budou značeny.
Objízdné odlehčovací trasy budou značeny.
Vymístění vozidel nastane 7 dní před plánovanými pracemi.
Zásobování UK bude řešeno samostatně.
Přístupové trasy na staveniště budou zabezpečeny mobilním oplocením.
Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení odstraněno.
DZ je možné v případě potřeby upravit dle stávající situace a potřeby.
U stínovaných částí DIO je možné změnit plochu stínu a nahradit ji svislým dopravním značením Z4, tak aby byla zachována funkce opatření.

- Obousměrný provoz
- Jednosměrný provoz
- Obchozí trasa

- Provizorní parkoviště
- Trvalé vodorovné dopravní značení (budoucí)
- Provizorní vodorovné dopravní značení
- Betonová svodidla
- Plotové zábrany

Investor: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC		
Zhotovitel: M-SILNICE		
Kreslil:	Lukáš Gubanec / tel.: 731 650 587 / e-mail.: gubanec@inkadz.cz	INKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n.L. IČO: 274 78 866 DIČ: CZ27478866 tel.: 495 581 318 e-mail: info@inkadz.cz web: www.inka-znaceni.cz
Zodp. projektant:	Lukáš Gubanec / tel.: 731 650 587 / e-mail.: gubanec@inkadz.cz	
Kontroloval:	Zdenek Šedivka / tel.: 605 273 134 / e-mail: sedivka@inkadz.cz	
Kraj: Královéhradecký	Okres: Hradec Králové	Obec: Hradec Králové
Akce: MILETA - II.ETAPA	DATUM	20.3.2026
	Č.ZAKÁZKY	26033
	STUPEŇ PD	
	MĚŘÍTKO	-
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	FORMÁT	A3
