


I/16 Samšina-Ohařice



Délka stavby 1050 m

7.7.2025 - 13.7.2025 - čištění příkopů a krajnice
za provozu postupně na označené pracovní místo
dle SD 210

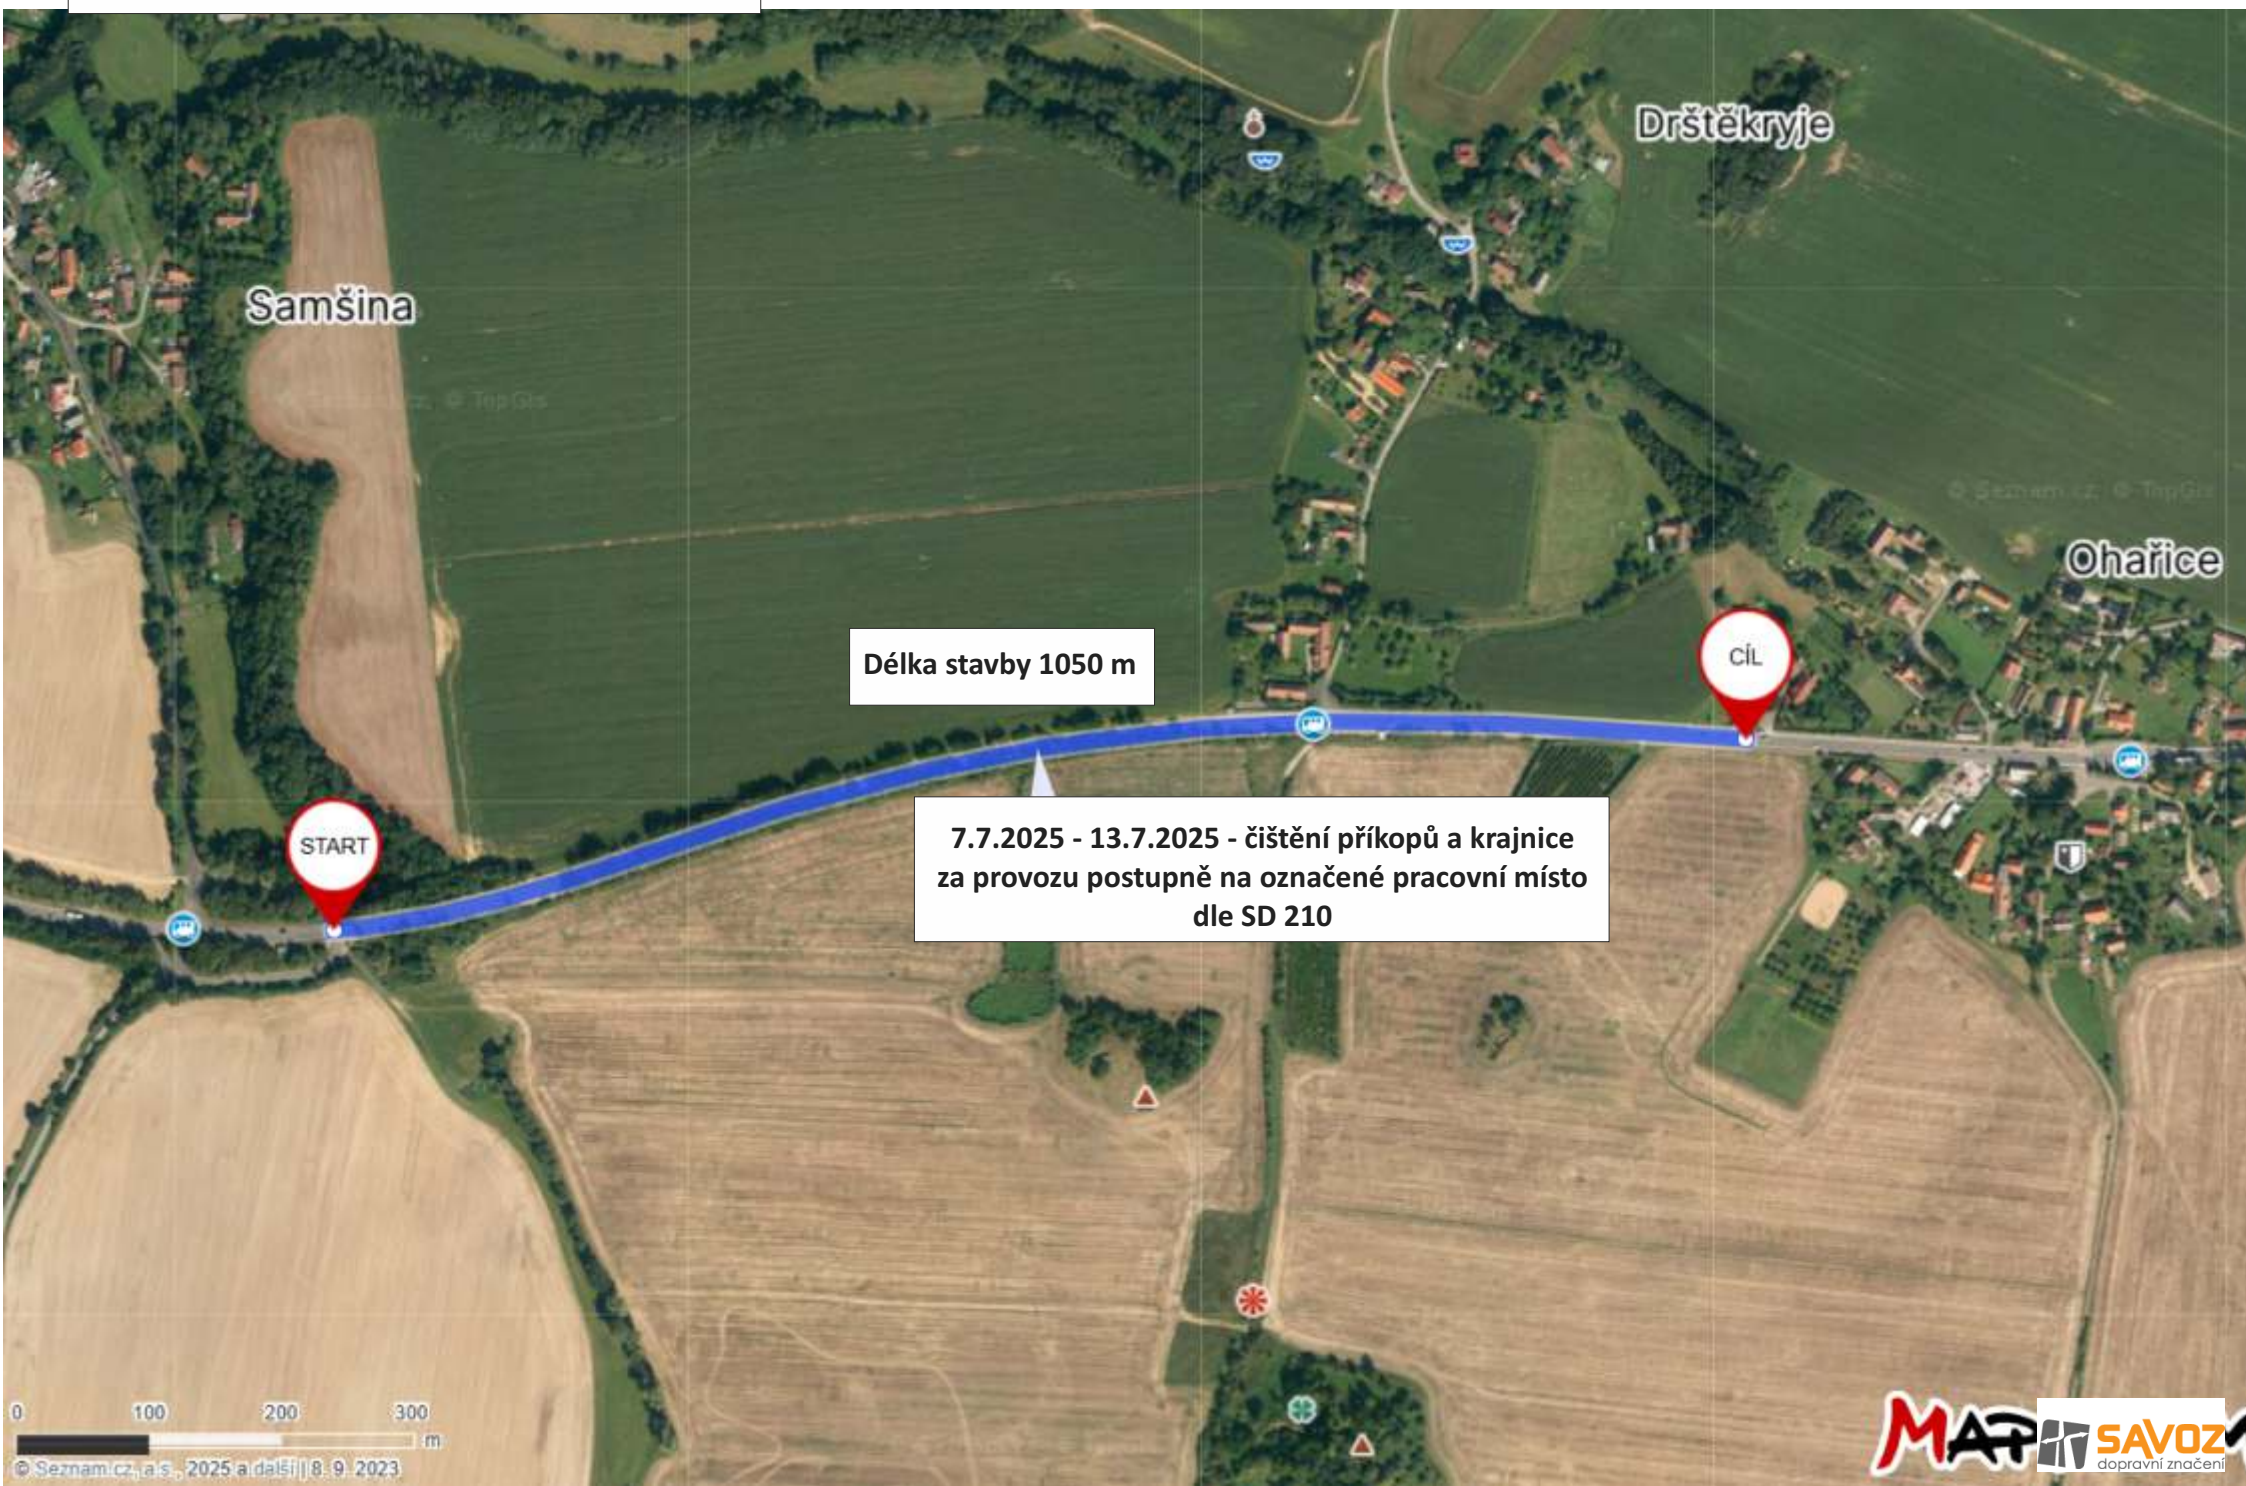

Pracovní místo
dlouhodobé
dvoupruh (třípruh a čtyřpruh obdobně)
krajnice
možné zúžení pravého pruhu

SD 210



- 1) Případně další snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek. Snižování rychlosti po 100 m
- U podélné uzavěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 18 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H



B20a – 80



A15, E 3a
(200 m až 800 m)
ŽZ fluo., třída RA3



I/16 Samšina-Ohařice

pokládka asfaltu



I/16 Samšina-Ohařice

pokládka asfaltu



směrové desky Z4
a výstražná světla
dle SD 231

7.7.2025 - 13.7.2025 - celoplošné frézování úseku
řízeno během pracovní doby regulovčičky,
po skončení frézování jízda po vyfrézovaném povrchu v celé délce úseku

I/16 Samšina-Ohařice

pokládka asfaltu



I/16 Samšina-Ohařice


pokládka asfaltu



směrové desky Z4
a výstražná světla
dle SD 231

18.7.2025 - 22.7.2025 - 2.etapa pravá polovina délka 525 m
22.7.2025 - 27.7.2025 - 2.etapa levá polovina délka 525 m

I/16 Samšina-Ohařice

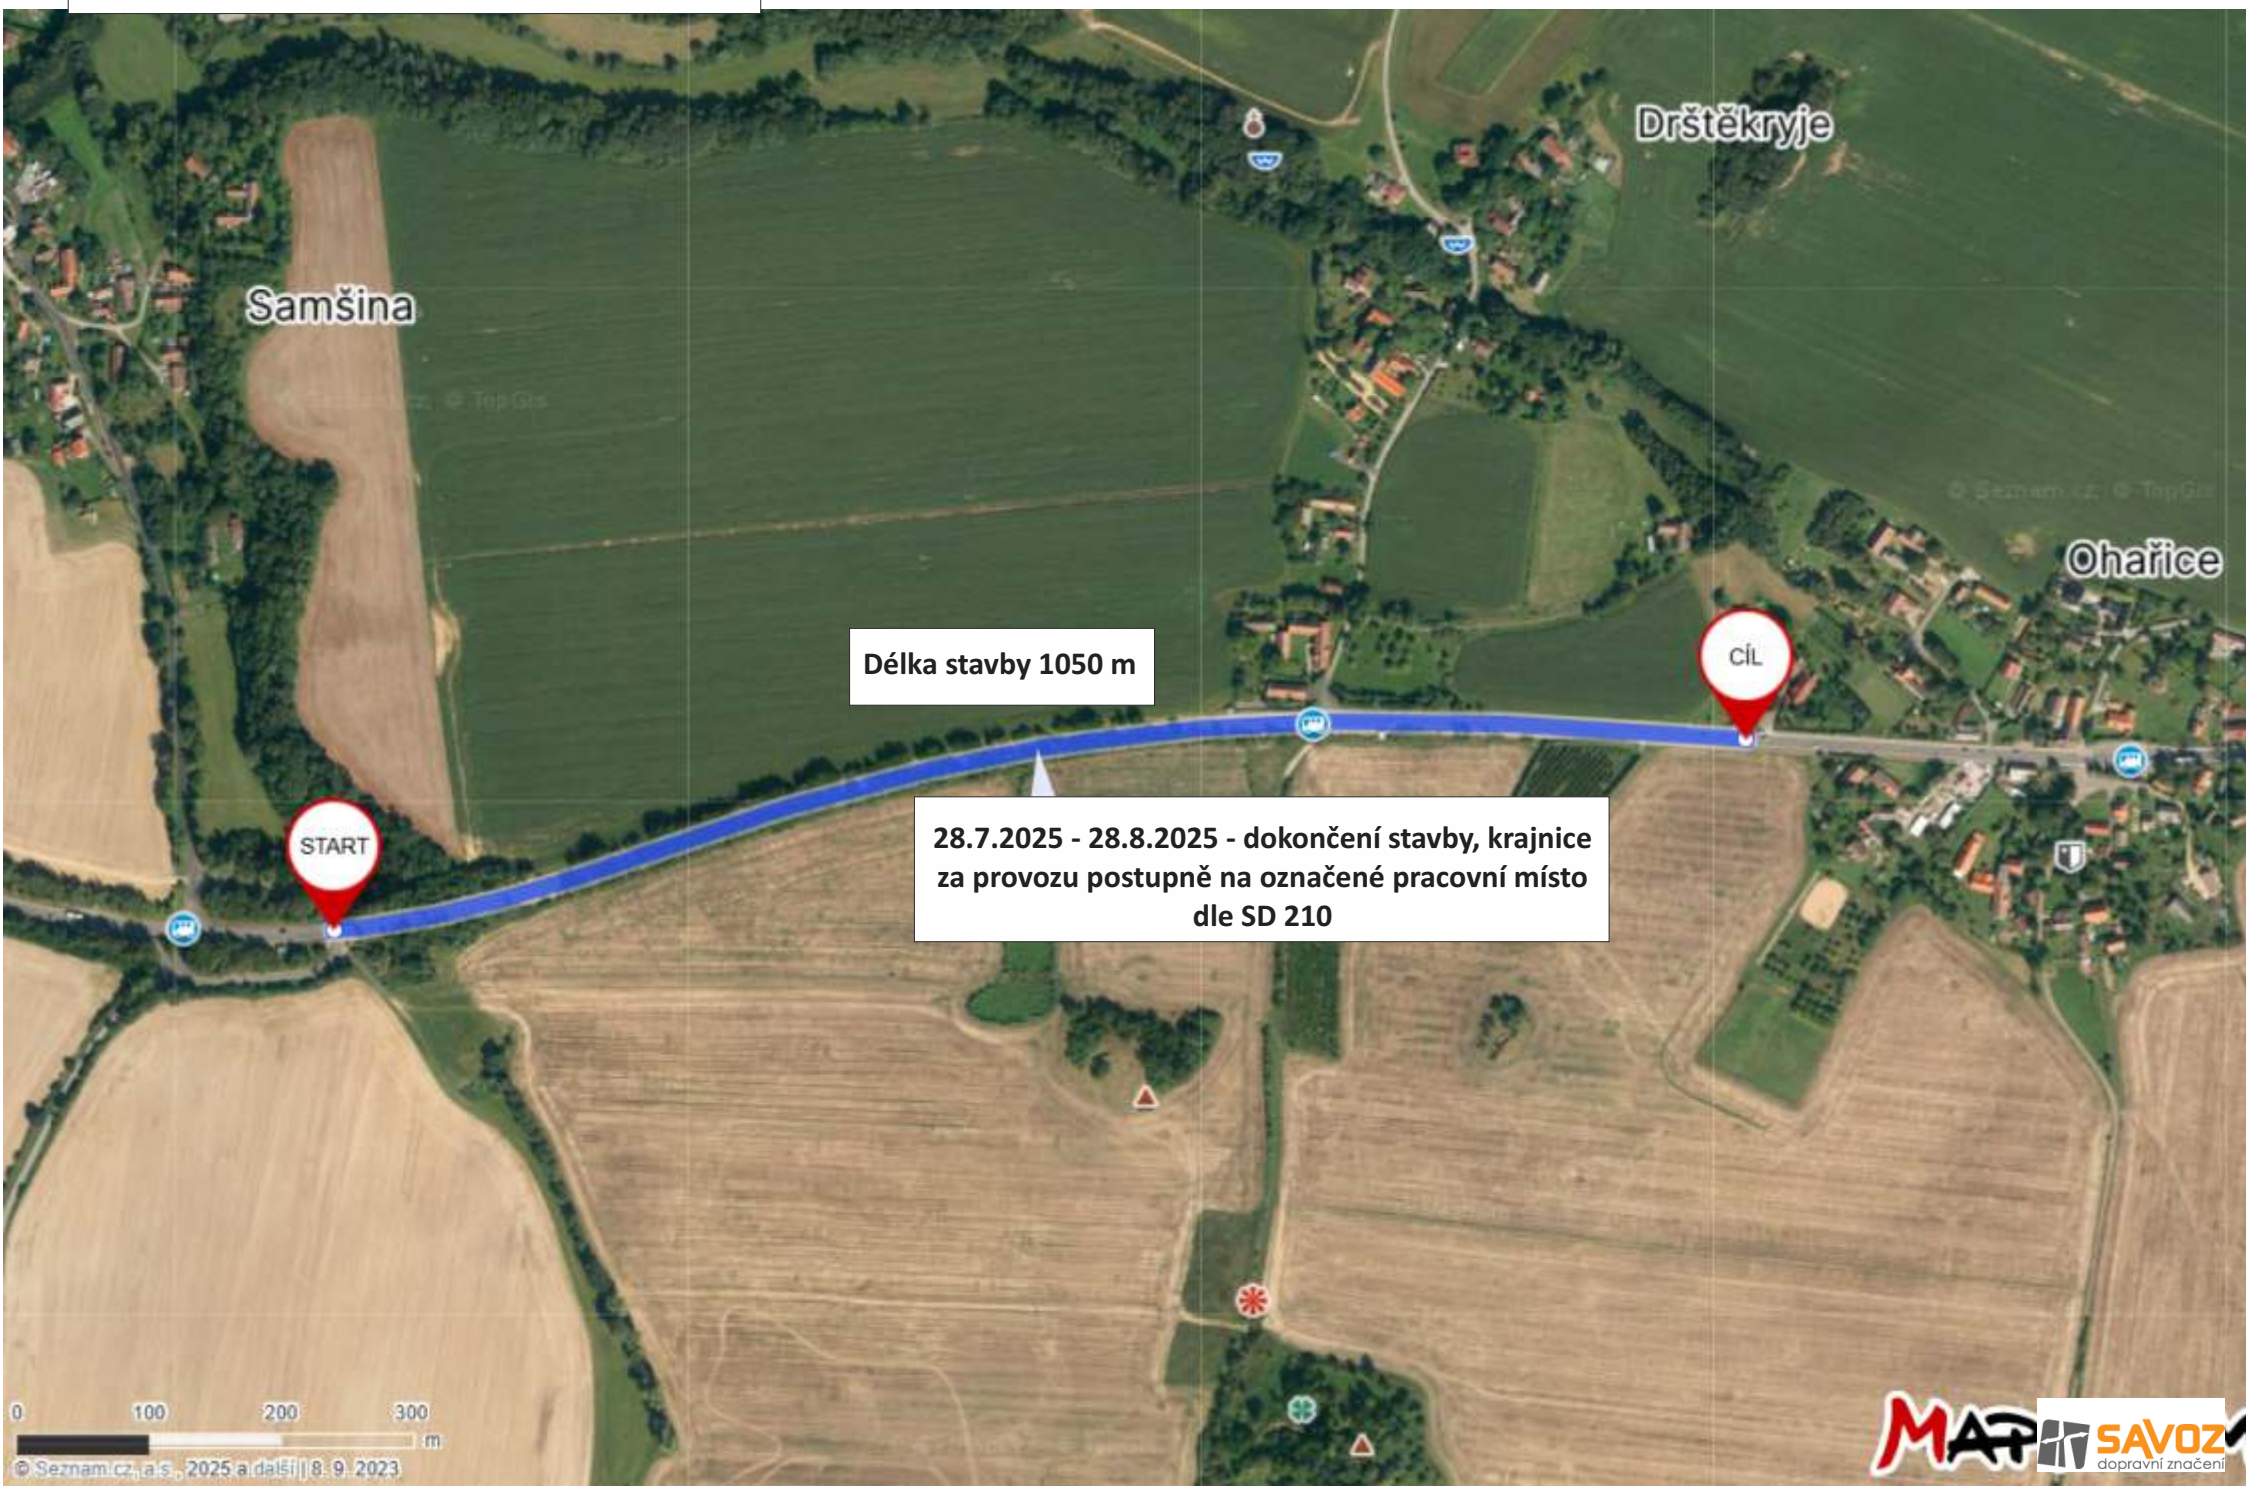

Délka stavby 1050 m

28.7.2025 - 28.8.2025 - dokončení stavby, krajnice
za provozu postupně na označené pracovní místo
dle SD 210
