

# SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

## Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne 28. měsíce listopadu roku 2012

mezi

**Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové**

IČ: 70889546

DIČ: CZ27502988

zastoupeným Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1**

IČ: 45274924

DIČ: 45274924

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1561  
zastoupeným ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu Hradec Králové  
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“ byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 620.707,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH 20 %	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
„I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Královéhradecký kraj – SO 102	620.707,-	124.141,-	744.849,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“, číslo veřejné zakázky 10PT-000097.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. - nejsou
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 3.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

Základní datum je 30. 8. 2012

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Objednatel a dodavatel/zhotovitel si ujednali, že dokumenty uvedené výše pod písmenem e), f) a g), stranám známe a považované jimi za nedílnou součást Smlouvy o dílo, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Tento Souhrn smluvních dohod byl schválen Radou Královéhradeckého kraje dne 22. 10. 2012, číslo usnesení 32/1392/2012.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 12-12-2012


Datum: 28. 11. 2012

PODEPSÁN

Jméno: Bc. Lubomír Franc  
Funkce: hejtman  
Králové

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Petr Dohnálek  
Funkce: ředitel závodu Hradec



Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

za objednatele  
Královéhradecký kraj

 **EUROVIA**  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
odštepny závod oblast Čechy východ  
závod Hradec Králové  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

za dodavatele/zhotovitele  
EUROVIA CS, a. s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

EUROVIA CS, a.s.	
odštěpný závod oblast Čechy východ	
Závod Hradec Králové - podatelna	
Došlo:	- 9. 11. 2012
Číslo:	1158

V Hradci Králové dne 6. 11. 2012

Naše zn. ŘSD/ 2308 /37000/2012/Dou

Číslo zakázky: 10PT-000097

Vyřizuje: Ing. Doubek

EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy východ

Závod Hradec Králové

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

*RB/2012*

Obchodní útvar  
co: ŘOV, ŘZ, PON, HS

Technický úsek

- Kalkulant *Mach*

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Sdružení zadavatelů Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, PSČ 500 03 Hradec Králové a Město Borohrádek se sídlem Husova 240, PSČ 517 24 Borohrádek, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

#### „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

zadávací řízení zahájeno dne 11. 9. 2012, výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. ŘSD/1757/37000/2012/Dou, ISPROFIN: 5001560002 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 2 níže uvedených uchazečů.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

Akciová společnost

IČ: 45274924



3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

**COLAS CZ, a.s.**  
Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Akciová společnost  
IČ:26177005

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem číslo 3 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

**Poučení:**


Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Hradci Králové dne 6. 11. 2012

Ředitelství silnic a dálnic ČR



  
.....  
Ing. Marek Novotný  
ředitel Správy Hradec Králové

Rozdělovník:

**EUROVIA CS, a.s.**

Odštěpný závod oblast Čechy východ

Závod Hradec Králové

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

**COLAS CZ, a.s.**

P. Jilemnického 21

503 01 Hradec Králové

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

**PRO:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce.

**Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

„I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
Královéhradecký kraj – SO 102	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	620.707,-	124.141,-	744.849,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)



Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 3.7  
dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis  funkce ředitel závodu Hradec Králové

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení EUROVIA CS, a. s.

Adresa Národní 10, 113 19 Praha 1

Datum 26. 9. 2012





## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
<p>Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority:</p> <p><b>Dokument</b></p> <p>(a) Smlouva o dílo                      (b) Zvláštní obchodní podmínky                      (c) Všeobecné obchodní podmínky                      (d) Technické podmínky                      (e) Dokumentace stavby                      (f) Dokumentace zhotovitele, která je součástí nabídky                      (g) Soupis prací                      (h) Seznam prací za denní sazby                      (i) _____</p>	1.1.1	<p><b>Identifikace dokumentu</b></p> <p>Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097                      Dle ZD z 08/2012 č. 10PT-000097</p>
Termín dokončení	1.1.9	<p>30. 11. 2012</p> <p>Tento termín je platný v případě uzavření všech smluv do 15. 10. 2012. Pokud se tak nestane, z důvodu klimatických podmínek se termín dokončení posouvá do max. 15. 5. 2013.</p>
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací *
Oprávněná osoba objednatele	3.1	Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové



Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše záruky za provedení díla (je-li)	4.4	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Lhůta pro předání programu prací	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	48 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	Nejsou
Měna platby	11.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6%* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	


Typ pojištění*	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %.	EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	10.000.000,- EUR	EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA
Pracovníci	800.000,- EUR	EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA
Jiná pojistná smlouva *	Viz kopie závazného potvrzení o pojištění	EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA

\* Objednatel upraví dle potřeby



Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Části stavby (jsou-li)	7.1	
Popis	Lhůta pro dokončení	Smluvní pokuta
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Datum: 26. 9. 2012

  
 \_\_\_\_\_  
 EUROXIA CS, a.s.  
 Ing. Petr Boukal  
 ředitel závodu Hradec Králové  
 dle plné moci

## ROZSAH POJISTNÉ OCHRANY

společnosti **EUROVIA CS, a.s.** podle pojistné smlouvy č. 7720537091  
sjednané s účinností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika  
IČ: 471 16 617 (vedoucí pojistitel)

Allianz pojišťovna a.s.  
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČ: 47115971 (pojistitel)

ČSOB Poistovňa, a.s.  
se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 325 416 (pojistitel)

Stavební a montážní pojištění – pojištění stavebních a montážních výkonů realizovaných v období od 1.1.2011 do 31.12.2013.

Pojištěnými jsou zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518/698 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551 a objednatelé jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy.

Pojištěnými jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo. Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.

Předmětem pojištění v rozsahu pojistné smlouvy jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.

Pojistné částky / limity plnění, spoluúčasti:

Oddíl I. – Pojištění věcí:


- Max. hodnota jednoho budovaného díla (kontraktu): pro mosty: 1 000 000 000,- Kč,  
pro ostatní stavby: 2 000 000 000,- Kč
- Materiál nebo díly dodané objednatelem: 50 000 000,- Kč, spoluúčast 50.000,- Kč
- Stávající majetek: 50 000 000,- Kč, spoluúčast 50.000,- Kč
- Zařízení a vybavení staveniště: 20 000 000,- Kč, spoluúčast 50.000,- Kč
- Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje: 30 000 000,- Kč, spoluúčast 50.000,- Kč
- Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků: 20 000 000,- Kč, spoluúčast 50.000,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu:

- Pojištění odpovědnosti za škodu: 20 000 000,- Kč, spoluúčast 100.000,- Kč

V případě zvláštního požadavku investora na další rozšíření pojištění může EUROVIA CS, a.s. sjednat pojištění individuální smlouvou.

V Praze dne 5.1.2012

  
Ing. Roman Dietrich  
Úsek pojištění hospodářských rizik

  
Ing. Dan Fojtík  
Úsek pojištění hospodářských rizik



## ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistník:  
EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem v Praze 1, Národní 10, PSČ 113 19  
IČ 452 74 924

Potvzujeme tímto, že pojistník má pro rok 2012 sjednanou pojistnou smlouvu č. 7-863-000412, v rozsahu uvedeném následovně.

### POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

#### LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

1. EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA CS jsou pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s provozními činnostmi zapsanými v obchodním rejstříku na území Evropy v rozsahu pojistné smlouvy pro jednu a každou pojistnou událost za pojistnou dobu s limitem plnění 10 000 000,- EUR (obecná odpovědnost)
2. EUROVIA CS, a.s. a členové skupiny EUROVIA CS jsou pojištěni pro případ odpovědnosti za výrobek na území Evropy v rozsahu pojistné smlouvy pro jednu a všechny pojistné události za pojistnou dobu s limitem plnění 10 000 000,- EUR
3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na movitých věcech převzatých k provedení objednané činnosti v rozsahu pojistné smlouvy s limitem plnění 400 000,- EUR
4. pojištění odpovědnosti za škodu na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá, v rozsahu pojistné smlouvy s limitem plnění 400 000,- EUR
5. odpovědnost za škodu třetí osobě na ušlém zisku a následná finanční škoda s limitem plnění 10 000 000,- EUR
6. pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s provozováním železniční dráhy a/nebo drážní dopravy s limitem plnění 10 000 000,- EUR
7. náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, s limitem plnění 800 000,- EUR



QBE, s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika  
 Tel.: +420 222 247 377, Fax: +420 222 245 640, E-mail: info@eurogap.cz

### SPOLUÚČASTI:

1. 3 846,- EUR/96 804,- Kč na území České republiky a Slovenské republiky
2. 28 846,- EUR/726 054,- Kč Evropa s výjimkou území České republiky a Slovenské republiky
3. 28 846,- EUR/726 054,- Kč pro škody vyplývající ze stavební činnosti vyšší než 1 500 000,- Kč
4. 10% min. 9 615,- EUR/242 009,- Kč, max. 57 692,- EUR/1 452 108,- Kč pro odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s provozováním železniční dráhy anebo v souvislosti s provozováním drážní dopravy

Pojistník má sjednáno toto pojištění ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným, a ve prospěch níže uvedených společností (pojištěných):


Pol. č.	Pojištěný	IČ
1.	EUROVIA Services, s.r.o.	61250210
2.	Pražská obalovna Herink, s.r.o.	28888995
3.	VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.	25947800
4.	Liberecká obalovna, s.r.o.	62245589
5.	EUROVIA Siiba, a.s.	64830551
6.	GJW Praha spol. s r.o.	41192869
7.	SILASFALT s.r.o.	62302370
8.	Jihočeská obalovna, spol. s r.o.	60827823
9.	OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.	49790633
10.	EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	60322870
11.	OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.	27485650
12.	EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.	36574988
13.	SGJW Hradec Králové spol. s r.o.	49285092
14.	MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o.	60915081
15.	VDZ S.A.R., s.r.o.	25741829
16.	EUROVIA Stone CZ, s.r.o.	62959018
17.	Eurovia Services, s.r.o.	45338159
18.	EUROVIA SK, a.s.	31651518
19.	EUROVIA Kamenolomy, a.s.	27096670

Potvrzujeme, že EUROVIA CS, a.s. nemá k dnešnímu dni ve vztahu k naší pojišťovně žádné dlužné pojistné.

V Praze dne 20.12.2011

Za pojistitele:

Ing. Oto Przybyla  
 Senior Underwriter



## ROZSAH POJIŠTĚNĚ OCHRANY

EUROVIA CS, a.s.

podle pojistné smlouvy č. 7720441630 sjednané s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group s účinností od 1. 1. 2010

### 1. Zivelní pojištění – „sdružený zivel“ pro:

- soubor vlastních budov a jiných staveb v hodnotě 1 894 811 000,- Kč
- soubor vlastních zařízení, strojů a ostatního inventáře v hodnotě 1 099 215 000,- Kč
- soubor cizího zařízení, strojů a ostatního inventáře oprávněně užívaných (leasing) na první riziko s limitem plnění 10 000 000,- Kč
- soubor zásob a hotových výrobků v hodnotě 69 500 000,- Kč
- soubor staveništního zařízení, strojů a ostatního inventáře v hodnotě 1 520 083 000,- Kč
- soubor zásob a hotových výrobků ve staveništním zařízení na první riziko s limitem plnění 15 000 000,- Kč
- soubor vlastních budov a jiných staveb v hodnotě 1 15 663 000,- Kč
- písemnosti, plány, výkresy a nosiče dat na první riziko s limitem plnění 10 000 000,- Kč
- věci zaměstnanců na první riziko s limitem plnění 5 000 000,- Kč
- peníze a cennosti na první riziko s limitem plnění 2 000 000,- Kč

### 2. Pojištění strojních zařízení na všechna nebezpečí (včetně odcizení a zivelního pojištění)

Toto pojištění je sjednáno pro rozhodující strojní vybavení organizace jako např. tímšery, dozery, nakladače apod. v hodnotě 174 747 682,- Kč.

### 3. Pojištění krádeží, vloupáním a loupežným přepadením pro:

- soubor ostatních vlastních věcí, movitých a zásob na první riziko s limitem plnění 25 000 000,- Kč
- soubor cizích věcí užívaných na první riziko s limitem plnění 5 000 000,- Kč
- vlastní cennosti na první riziko s limitem plnění 500 000,- Kč
- přeprava peněz na první riziko s limitem plnění 2 000 000,- Kč
- soubor zeměměřických přístrojů včetně příslušenství, přenosné výpočetní techniky, ručního elektrického nářadí a pneumatického nářadí na první riziko s limitem plnění 1 000 000,- Kč

V Praze

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka  
předseda představenstva

Grégoire François Jean Pimasseau  
člen představenstva

V Praze 18. 12. 2009

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Ing. Stanislav Jirák  
vedoucí úseku hospodářských rizik  
sekcce pojištění

EUROVIA CS, a.s.  
Národní 10  
113 19 Praha 1

KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
GENERALNÍ ŘEŠITELSTVÍ  
TEMPLOVA 747  
PRAHA 1

Lucie Štěpanová  
Usek pojištění hospodářských rizik

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV STAVBY:** „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

### Živičné práce

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách



akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši  $y$  % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ $y$ “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 9) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.


Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
„I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 a 4 této zadávací dokumentace.

Datum: 26. 9. 2012

  
\_\_\_\_\_  
EUROVIA CS, a. s.  
Ing. Petr Boukal  
ředitel závodu Hradec Králové  
dle plné moci

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 007 I/36 Borohrádek

Objekt: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305

Objednavatel: ING. L. HLADÍKOVÁ

Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 620 707,16 Kč

Cena celková: 620 707,16 Kč

DPH: 124 141,43 Kč

Cena s daní: 744 848,59 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 400,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 551,77 Kč

Vypracoval zadání: Ing. A. Dejmek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.12.2011

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 007 I/36 Borohrádek  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce			
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	M3	252,600	42 285,24
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	11 160,00
			Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby			
			PEVNÁ CENA			
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	7 440,00
			GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických (12x tiskem)			
			PEVNÁ CENA			
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	32 550,00
			SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních			
			PEVNÁ CENA			
0			Všeobecné konstrukce a práce			93 435,24
- 1	2	11317	Zemní práce			
			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	48,720	7 247,10
			VČ OČIŠTĚNÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU SUS RK			
			ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	142,100	19 416,54
			VČ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU TRVALOU			
			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	31,500	1 918,35
			VČ OČIŠTĚNÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU DOČASNOU PRO DALŠÍ POUŽITÍ			
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4	M3	101,500	8 857,91
			VČ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU TRVALOU			
			ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	7,000	251,30
			HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	9,000	1 799,01
			VČ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU DOČASNOU			
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,600	535,58
			ŠD			

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 007 I/36 Borohrádek  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP	M3	2,700	623,86	1 684,42
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	406,000	9,87	4 007,22
<b>I</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>47 109,94</b>
2		<b>Základy</b>				
11	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	52,000	274,13	14 254,76
12	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD TL.250 MM	M3	101,500	554,34	56 265,51
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>70 520,27</b>
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
13	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,200	2 133,38	426,68
14	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP	M3	0,900	519,92	467,93
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>894,61</b>
5		<b>Komunikace</b>				
15	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM SI TL.150 MM	M2	406,000	182,85	74 237,10
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD TL 200 MM	M3	81,200	490,75	39 848,90
17	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 KG/M2	M2	392,000	10,41	4 080,72
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SP 0,3 KG/M2	M2	392,000	8,28	3 245,76
19	574131	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM	M2	392,000	263,25	103 194,00

103 194,00




**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: 007 I/36 Borohrádek  
Objekt: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305  
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce sil. II/305

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33 91743a		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ VČ ZISKÁNÍ ZE SKLÁDKY DOČASNÉ	M	31,500	151,74	4 779,81
34 91743b		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ POUŽITÉ OBD. TYPU, VČ. NÁKUPU	M	56,500	151,74	8 573,31
35 919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	37,000	24,62	910,94
9		Ostatní konstrukce a práce				24 320,70

**Celkem:** 620 707,16



**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 3.2**  
(předkládá uchazeč v nabídce)  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Od: EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 45274924

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“, číslo veřejné zakázky 10PT-000097 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.


Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:





- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Hradci Králové dne 26. 9. 2012

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Bůkal  
EUROVIA CS, a.s  
ředitel závodu Hradec Králové  
dle plné moci






Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Přílohou tohoto dokumentu jsou technologické postupy popřípadě výkresy obsahující metody použité dodavatelem k provedení stavby.

V Hradci Králové dne 26. 9. 2012

  
\_\_\_\_\_  
EUROMIA CS, a.s.  
Ing. Petr Boukal  
ředitel závodu Hradec Králové

Akce: „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové

Uchazeč: Eurovia CS a.s. – odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Hradec Králové

## Zařízení staveniště a výroby

Zařízení staveniště – Zhotovitel nebude na stavbě využívat mobilní zařízení staveniště. Přímo na stavbě bude umístěno pouze mobilní WC. Hlavní kancelář stavby bude umístěna na adrese Eurovia CS a.s., Piletická 498, Hradec Králové. Parkování silničních vozidel a mechanismů bude řešeno formou pronájmu pozemku

Laboratoře – Zajišťování laboratorní činnosti pro stavbu bude prováděno společností Eurovia Servises s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, Piletická 498, která má pro tuto činnost potřebné certifikáty a akreditaci

Výroby asfaltových směsí – Obalované směsi budou dodávány z Východočeské obalovny s.r.o. v Hradci Králové ze vzdálenosti 31 km od místa stavby.

Plán trasy pro dodávku asfaltových směsí na stavbu přikládáme.


V Hradci Králové dne 26.9. 2012

Zpracoval: Tomáš Mach

## Plán tras dodávky asfaltových směsí na stavenišťě „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

Východočeská obalovna s.r.o. Hradec Králové - Pláčice

- dovozná vzdálenost 31 km
- typ ASKOM VS 240 s hodinovým výkonem 240 tun

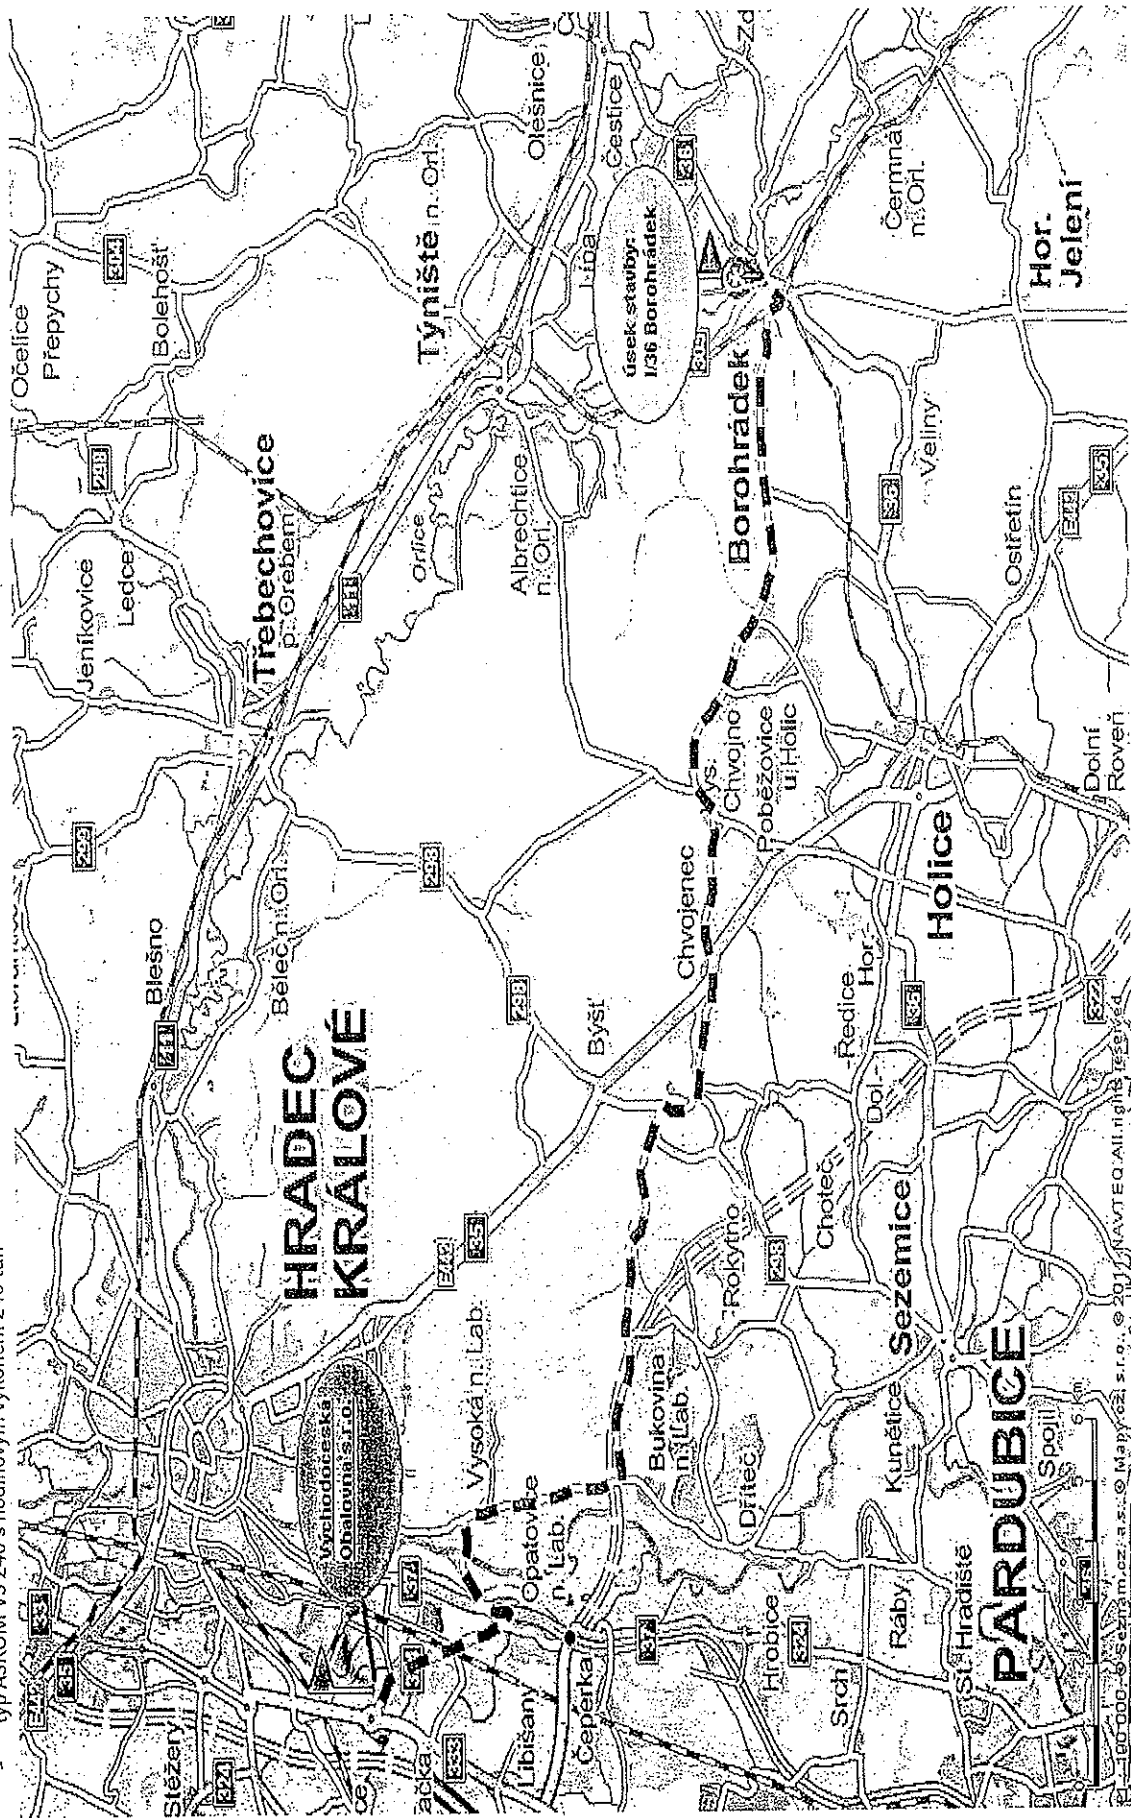

Akce: „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové

Uchazeč: Eurovia CS a.s. – odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Hradec Králové

## **Stručné schéma postupu prací při realizaci stavby**

Předpokládané zahájení prací – 15.10.2012

Termín dokončení stavby – 30.11.2012

Je navržen tento postup výstavby :

- a) předání staveniště, vytyčení sítí, projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření během výstavby
- b) frézování – zda celoplošné nebo po částech, to závisí na projednání DIO s příslušnými úřady
- c) zřízení uzavírky z důvodu oslabení konstrukce
- d) provedení příslušných prací dle výkazu výměr, tzn. zemní práce, odstranění krytů vozovky, odstranění kostek, odstranění obrub, odkopávky, úprava pláně, přeložka kabelů NN a SEK, příprava nasvícení přechodu
- e) demolice vpustí a realizace nových včetně nového potrubí přípojek, výšková úprava poklopů, mříží, hrnců, provedení nových obrub a krajníků
- f) provedení nových vrstev vozovky ( ŠD, vrstvy stabil.cementem), provedení živičných vrstev včetně postříků
- g) provedení zálievek spár, provedení ostatních prací dle VV
- h) provedení nového dopravního značení, nasvícení přechodu, kompletace stavebních prací
- i) odstranění dopravně inženýrských opatření během výstavby a provedení přejímky stavby objednatelem

Upozorňujeme, že postup prací je závislý na projednání DIO před zahájením vlastních prací a tento návrh nemusí být zcela platný.


V Hradci Králové 26.9.2012

Zpracoval: Tomáš Mach

# Harmonogram stavby

Číslo činnosti	Zhotovitel Podzhotovitelé	Činnost	2012																	
			září			říjen			listopad			prosinec								
			36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
<b>STAVENIŠTĚ</b>																				
01		Rekonstrukce sil. I/36																		
02		Rekonstrukce sil. II/305																		
03		Rekonstrukce chodníků																		
04		Přeložka kabelu NN																		
05		Nasvícení chodceckého přechodu																		
06		Přeložka kabelů SEK																		

Termín zahájení stavby : 15.10.2012  
 Termín dokončení stavby : 30.11.2012

 Uzlový bod výstavby - 19.11. pokládka živ.vrstev



**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 3.7**

(předkládá uchazeč v nabídce)

**PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ BETONOVÝCH A ASFALTOVÝCH SMĚSÍ**

Společnost: EUROVIA CS, a.s.,  
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1,  
IČ: 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“, číslo veřejné zakázky 10PT-000097 (dále jen „uchazeč“), tímto prohlašuje a potvrzuje, že

*vlastní dostatek prostředků pro zajištění potřebného množství asfaltových směsí pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky v době jejího plnění, i s ohledem na předpokládané dovozové vzdálenosti – VČO Východočeská obalovna, s. r. o., Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové – spoluvlastník z jedné třetiny*

Předpoklad odpovídajících dovozových vzdáleností dokládá uchazeč příloženým plánem tras, po kterých bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě tak, aby tyto splňovaly nezbytné technologické parametry.

V Hradci Králové dne 26. 9. 2012

  
\_\_\_\_\_  
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Retr Boukal

ředitel závodu Hradec Králové

dle plné moci



**Plán tras dodávky asfaltových směsí na stavenišťě „I/36 Borohrádek – úprava křižovatek“**

Východočeská obalovna s.r.o. Hradec Králové - Pláčice

- dovozná vzdálenost 31 km
- typ ASKOM VS 240 s hodinovým výkonem 240 tun

